UNIVERSIDADE LaSalle
Viver é evoluir.

UNIDADE 2

Gerenciamento de PROJETOS

GESTÃO E NEGÓCIOS

Organizadores:
André Kohl | Fábio Maia | Guilherme Gonçalves | Robinson Scholz

Processo de Gerenciamento de um Projeto

Prezado estudante,

Estamos começando uma unidade desta disciplina. Os textos que a compõem foram organizados com cuidado e atenção, para que você tenha contato com um conteúdo completo e atualizado tanto quanto possível. Leia com dedicação, realize as atividades e tire suas dúvidas com os tutores. Dessa forma, você, com certeza, alcançará os objetivos propostos para essa disciplina.

Objetivo Geral

Instrumentar e capacitar os alunos para os conceitos e práticas da gerência de projetos.

Objetivos Específicos

- Apresentar o entendimento de gerenciamento de projetos, com a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas relacionadas às áreas de conhecimento do projeto,
- Identificar as diferentes metodologias e fases do gerenciamento de projetos;
- Conhecer os processos e como se desenvolve um plano de gerenciamento de projetos.

Questões Contextuais

- Quais são os grupos de processos de gerenciamento de projetos?
- Quais são áreas de conhecimento de Projetos?
- Como as áreas de conhecimento de Projetos podem contribuir para o alcance da Excelência Gerencial?

2.1 Iniciação do Projeto e Processos de Gerenciamento


Mãos à obra! Quando falamos em gestão de projeto, é importante lembrar que os rumos e as premissas de um projeto são delineados na primeira fase, ou seja, na sua iniciação. No processo de iniciação, ocorre a identificação do novo projeto e são estabelecidos os primeiros parâmetros: objetivo, justificativa, partes envolvidas (stakeholders), público-alvo, escopo, recursos necessários, gerente do projeto, entre outros. A sua formalização é realizada pela elaboração do Termo de Abertura do Projeto (TAP), documento emitido pela alta administração, que dá autoridade ao gerente do projeto, autoriza e comunica formalmente o seu início à organização (MENEZES, 2009).

Esse também é o primeiro passo para documentação do projeto, que será gerenciada no contexto do gerenciamento da integração do projeto. O TAP será estudado mais detalhadamente a seguir.

É importante destacar que, com o desenvolvimento do TAP, dá-se visibilidade e direcionamento ao projeto, alcançando desde a cúpula da organização até a equipe envolvida.

Segundo o PMI (2017), existem cinco grupos de processos conforme mostra a figura a seguir (ALVES; GUIMARÃES; TANNÚS, 2017):

Figura 2.1 – Grupos de processos de gerenciamento de projetos.

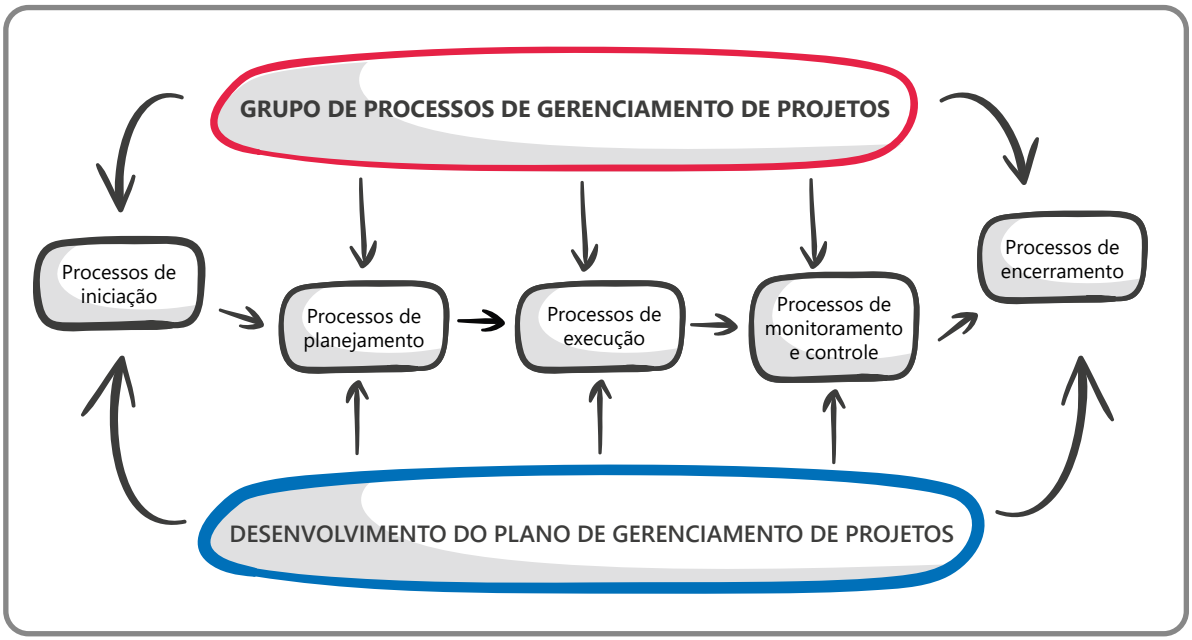

Fonte: Adaptado por Universidade La Salle (2020) com base em Alves, Guimarães e Tannús (2017).

2.1.1 Áreas de Conhecimento de Gerência de Projetos

Os processos de gerenciamento de projetos são divididos em nove áreas diferentes do conhecimento, que descrevem os conhecimentos e práticas em termo de processos que as compõem (ALVES; GUIMARÃES; TANNÚS, 2017):

- Gerenciamento de Integração: busca assegurar a coordenação dos diversos elementos do projeto, com base nos objetivos e nas alternativas eventualmente concorrentes;
- Gerenciamento de Escopo: objetiva garantir que o projeto inclua somente o trabalho necessário;
- Gerenciamento de Cronograma: inclui os processos necessários para que o projeto se realize no tempo aprazado.
- Gerenciamento de Custos: processos envolvidos na elaboração dos orçamentos e no controle de custo;
- Gerenciamento de Qualidade: inclui as atividades que determinam as políticas de qualidade do projeto;
- Gerenciamento de Recursos: organiza e gerencia os recursos demandados pelo projeto;
- Gerenciamento de Comunicações: refere-se à geração, coleta, distribuição, armazenamento, recuperação e destinação final das informações do projeto;
- Gerenciamento de Riscos: trata do controle de riscos do projeto, a fim de reduzir a incidência e o impacto de eventos negativos;
- Gerenciamento de Aquisições: inclui a aquisição de produtos ou serviços necessários de fora da equipe do projeto.

Figura 2.2 – Integração das áreas de conhecimento em Gestão de Projetos.



Fonte: Adaptado por Universidade La Salle (2020) com base em PMI (2017).

Chegou a hora de encaixar as peças! E, para isso, é fundamental falar que o **gerenciamento da integração é o núcleo do gerenciamento de projetos**. Ele é composto pelos processos do dia a dia de um projeto, tais como: desenvolver o termo de abertura, identificar as partes interessadas, desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, encerrar as fases, encerrar o projeto. É importante destacar que o gerenciamento de integração inclui as atividades de identificar, definir, combinar, unificar e coordenar as diversas etapas com os quais o gerente de projetos conta para garantir que todas as partes funcionem juntas (VARGAS, 2009).

A integração consiste em fazer escolhas entre os pontos que devem concentrar os recursos e esforços, antecipando problemas, tratando-os antes de se tornarem críticos, coordenando o trabalho e visando ao bem geral do projeto. Segundo o PMI (2017), os esforços de integração envolvem compensações entre os objetivos e as alternativas conflitantes.

É importante destacar que os profissionais experientes em gerenciamento de projetos sabem que não existe uma maneira única de gerenciar um projeto. Eles aplicam os processos de gerenciamento em diferentes ordens e graus de rigor para obter o desempenho desejado. De acordo com o PMI (2017), a percepção de que um processo específico não é necessário não significa que ele não deva ser abordado.

O gerenciamento da integração de um projeto envolve os seguintes elementos:

- A coordenação de vários elementos do projeto;
- Integração com as operações correntes;
- Integração entre escopo do projeto e o escopo do produto.



DESTAQUE

O papel do gerente de projeto é ser integrador; ele é quem enxerga todo o quadro do projeto.

Para melhor compreensão referente ao tema, vamos apresentar exemplos de atividades desenvolvidas pela equipe de gerenciamento de projetos e que devem estar integradas (PMI, 2017):

- Analisar e entender o escopo do projeto;
- Entender como coletar as informações identificadas e transformá-las em um plano de projeto;
- Realizar as atividades para produzir as entregas do projeto;
- Medir e monitorar todos os aspectos do progresso do projeto; e
- Tomar as devidas ações para garantir os objetivos.

2.1.2 Processo de Integração das Etapas do Projeto

O processo de integração das etapas de um projeto constitui-se de metodologias organizadas de forma a auxiliar o seu desenvolvimento como um todo. Cada etapa envolve requisitos e situações específicas para atingir um determinado objetivo.

Em conformidade com o Guia PMBOK (PMI, 2017), as seguintes etapas são sugeridas:

- Desenvolver o termo de abertura do projeto;
- Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto;
- Dirigir e gerenciar a execução do projeto;
- Monitorar e controlar o trabalho do projeto;


- Realizar o controle integrado de mudança;
- Encerrar a fase ou projeto.

Em resumo, esta é a fase que documenta, monitora e controla o trabalho, inclusive as necessidades de mudança e encerramento do projeto. Enfim, o gerenciamento da integração do projeto visa à documentação das ações necessárias para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários processos e atividades de cada uma das áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos. Nesse contexto, o gerenciamento da integração inclui as ações que vão gerar o documento de planejamento do projeto, o Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP), que será estudado ao final desta unidade (PMI, 2017).

2.1.3 Processos do Gerenciamento da Integração

O gerenciamento da integração visa documentar as ações para definir, preparar, integrar e coordenar os planos de gerenciamento específicos de cada uma das áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos. A figura a seguir ilustra as fases de elaboração desse documento.

Figura 2.3 – Processos de Gerenciamento da Integração do Projeto.

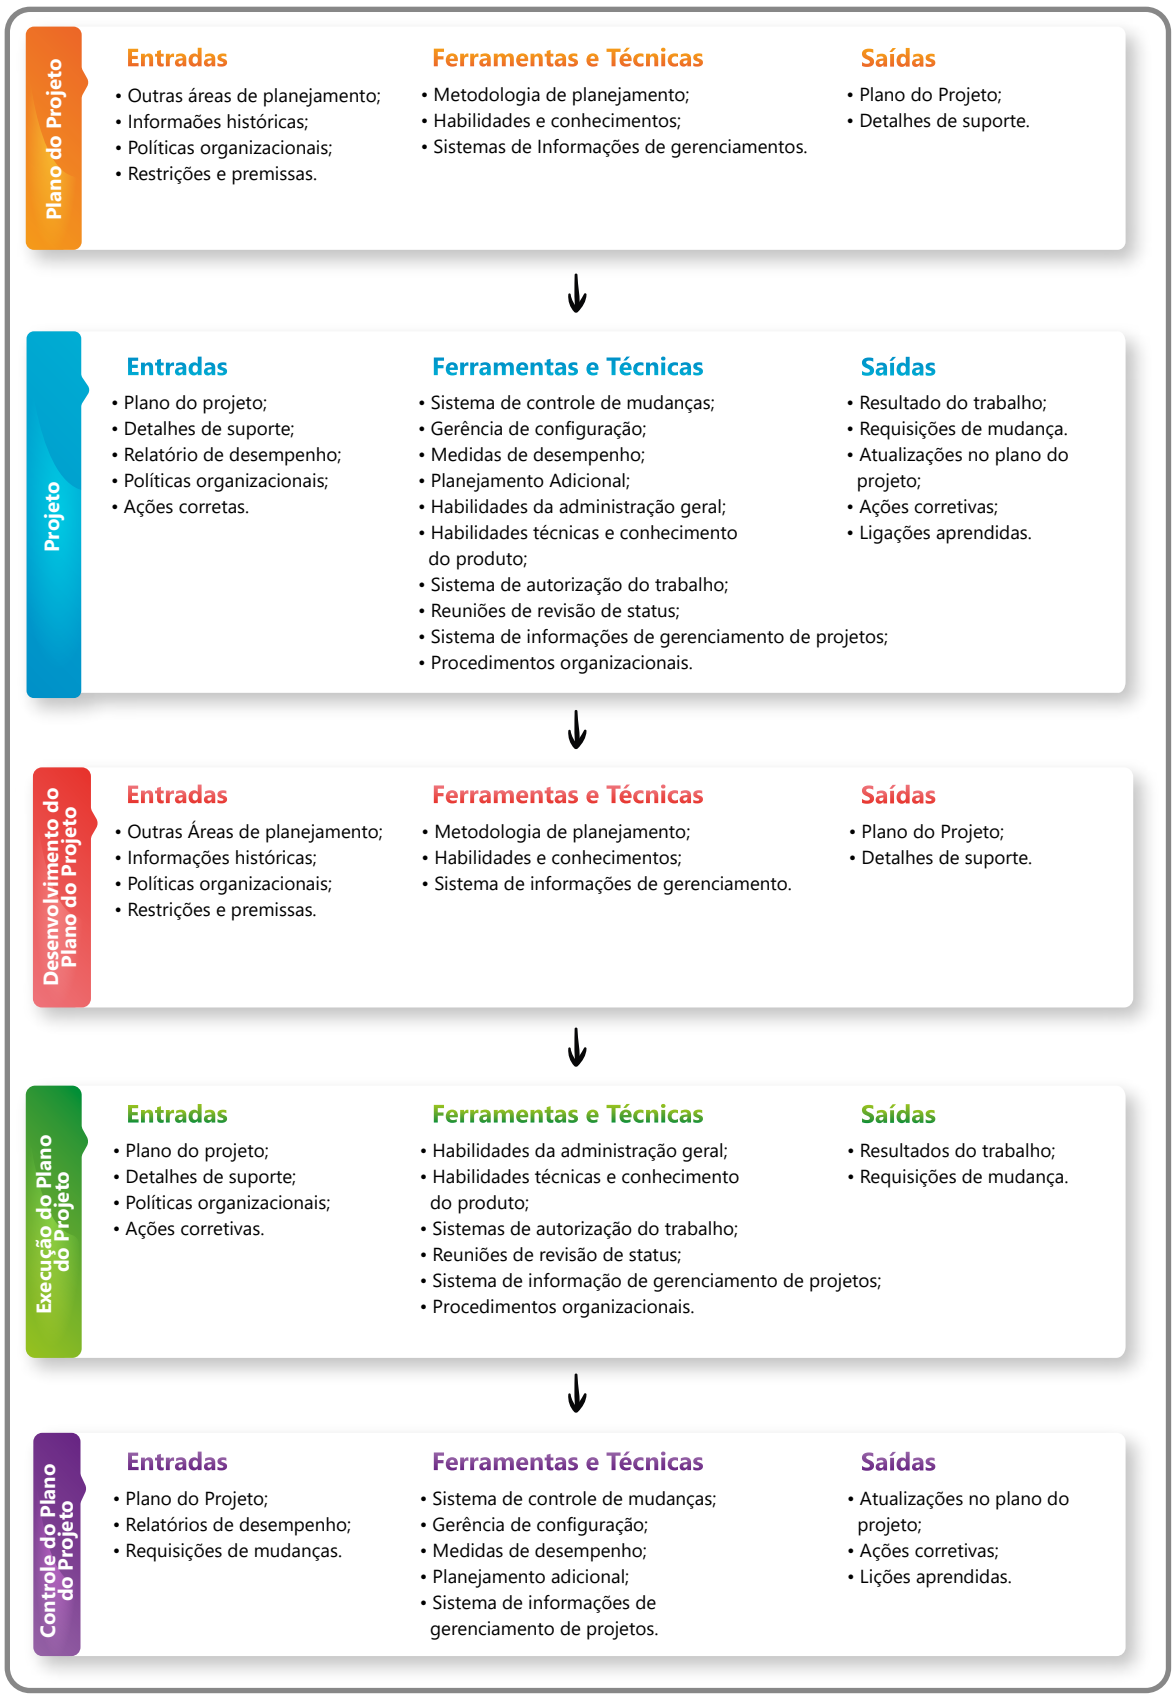

Fonte: Adaptado pelos autores (2019) com base em PMI (2017).

A figura anterior demonstra as etapas do desenvolvimento do plano de gerenciamento da integração do projeto, as quais interagem entre si e com os processos das demais áreas de conhecimento. O desenvolvimento do plano do projeto utiliza as saídas de outros processos para criar um documento consistente e coerente que possa ser usado para guiar tanto a execução quanto o controle do projeto. A execução é o processo básico de realização do plano do projeto, pois nele são coordenadas e direcionadas as diversas técnicas organizacionais do projeto. Em conformidade com o Guia PMBOK (PMI, 2017), ocontrole geral de mudanças preocupa-se em manter a integridade das medidas básicas de desempenho e gerenciar as mudanças no momento em que ocorrem.

2.1.4 Gerenciamento do Escopo do Projeto


O escopo do projeto é a descrição dos resultados esperados. É responsável por detalhar as atividades que serão realizadas, as alocações dos recursos e suas funções para se chegar ao objetivo final. Segundo Vargas (2009, p. 25):

> O gerenciamento de escopo tem como objetivo principal definir e controlar os trabalhos a serem realizados pelo projeto de modo a garantir que o produto, ou serviço desejado seja obtido através da menor quantidade de trabalho possível, sem abandonar nenhuma premissa estabelecida no objetivo do projeto.

Ou seja, como no exemplo da montagem das peças de um quebra-cabeça, o foco na união e encaixe das peças deve ser mantido do início ao fim. Peças de outros quebra-cabeças, por exemplo, não devem ser misturadas ao que está sendo montado e, muito embora não exista uma forma única de montar um quebra-cabeça, o trabalho deve ser controlado com foco no objetivo final.

Nesse sentido, a preocupação fundamental é definir e controlar o que está ou não incluído no projeto. A figura a seguir fornece uma visão dos principais processos do gerenciamento do escopo do projeto.

Figura 2.4 – Processos de Gerenciamento do Escopo.

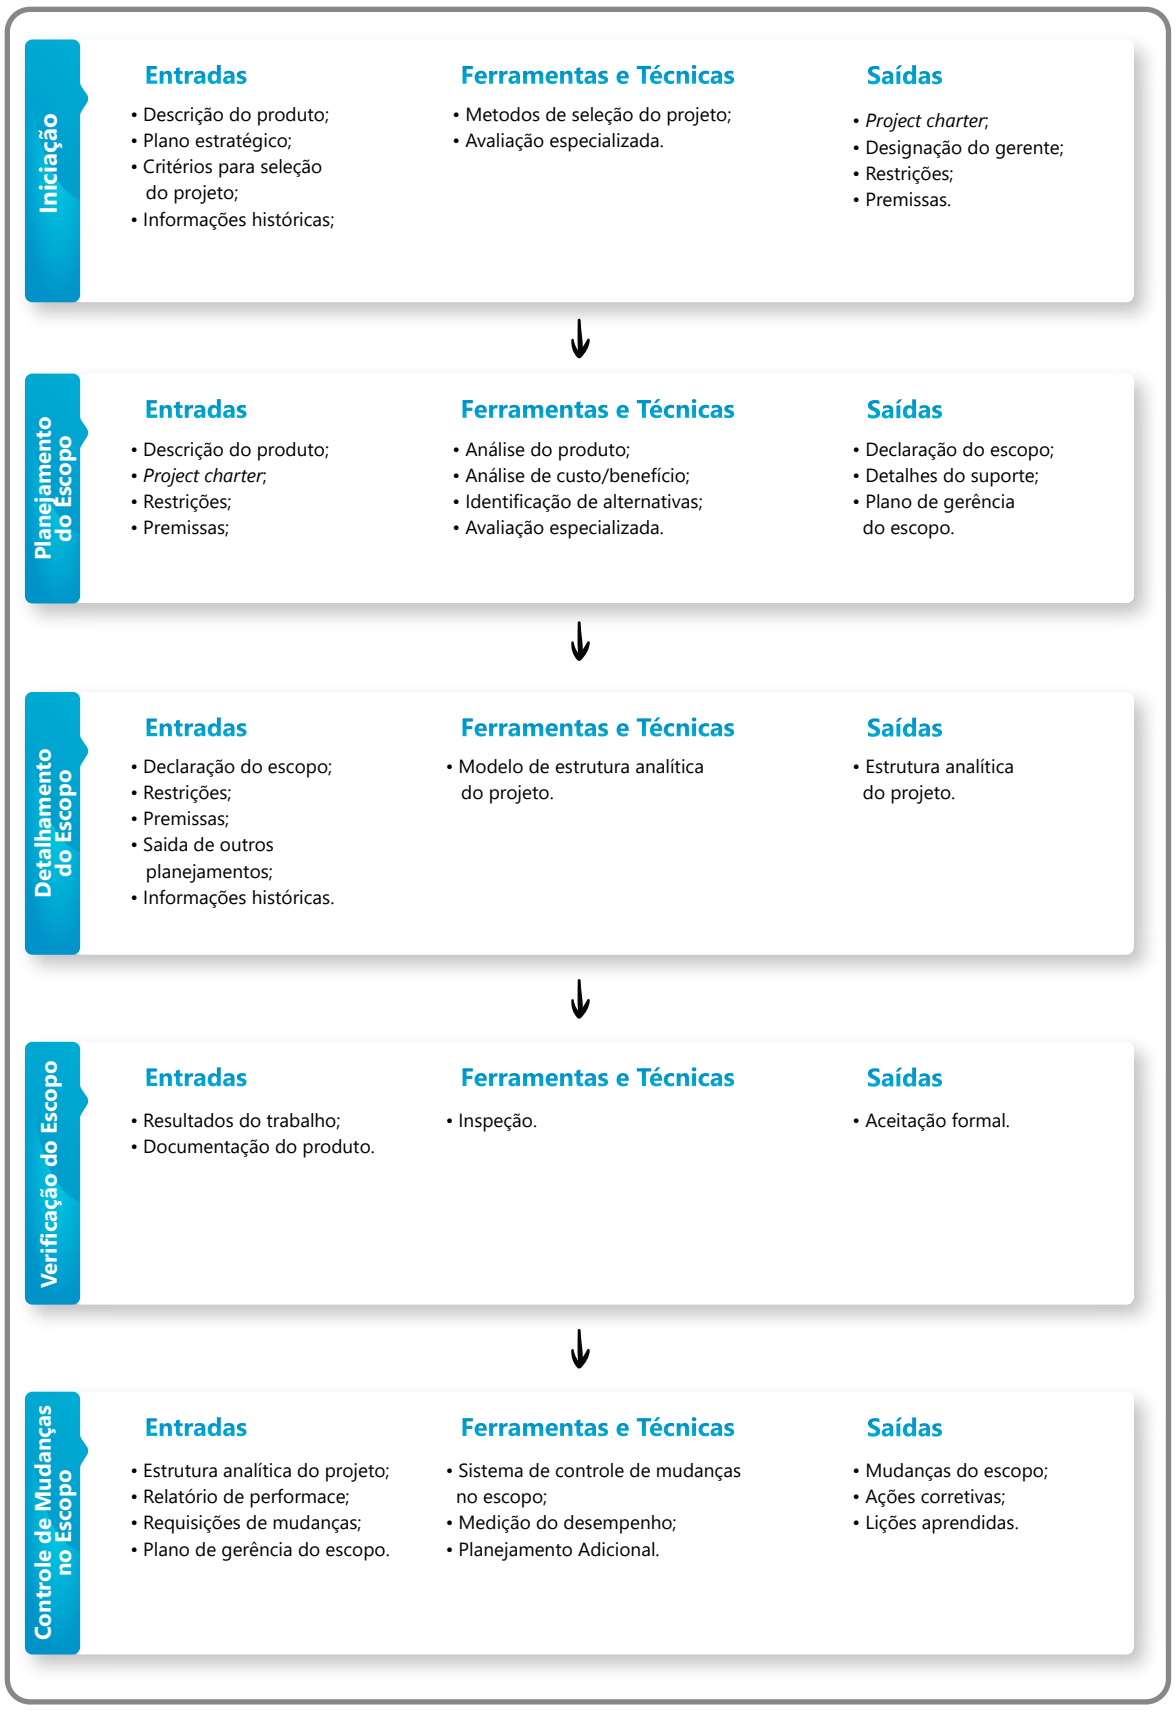


Fonte: Adaptado pelos autores (2019) com base em PMI (2017).

A iniciação é o processo de reconhecimento formal que liga o projeto ao trabalho em execução na organização. O planejamento do escopo é o processo de desenvolvimento de uma declaração escrita do escopo como base para decisões futuras, incluindo os critérios usados para determinar se o projeto ou a fase foi completado com sucesso. O detalhamento do escopo é a subdivisão dos principais subprodutos do projeto, a fim de obter melhor precisão das estimativas de custo, tempo e recursos. A verificação do escopo é a formalização do aceite do escopo do projeto pelas partes envolvidas. O controle de mudanças no escopo consiste no gerenciamento das mudanças, quando e se elas ocorrerem, e deve ser completamente integrado com os outros processos de controle de gerenciamentos (MENEZES, 2009).

2.1.4.1 *Estrutura Analítica de Projetos (EAP)*

Uma das principais saídas de processos do gerenciamento do escopo é a Estrutura Analítica do Projeto (EAP), pois ela apresenta o processo e a subdivisão do trabalho e das entregas do projeto em componentes menores e de mais fácil gerenciamento. A EAP é um diagrama que organiza e define o escopo total do projeto por meio da representação em forma de árvore, como pode ser visto na figura a seguir, que apresenta a EAP de um projeto de academia esportiva.

Figura 2.5 – EAP de uma academia esportiva.

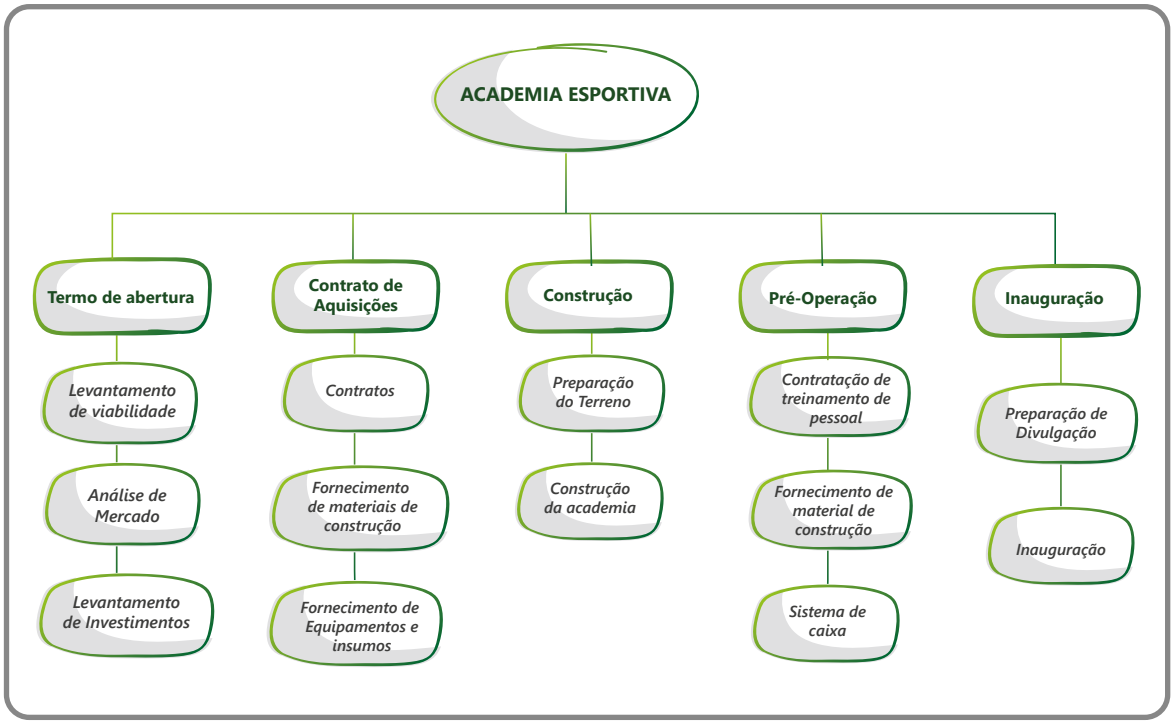


Fonte: Adaptado por Universidade La Salle (2020) com base em Alves, Guimarães e Tannús (2017).

Como pode ser observado na figura, o projeto do exemplo foi dividido em cinco etapas, e as atividades de cada uma delas foi demonstrada, de modo a facilitar o desenvolvimento do cronograma, a estimativa de recursos e a duração do projeto.

2.1.4.2 Outros Exemplos de EAPs


Figura 2.6 – EAP aplicada ao desenvolvimento de um Software versão 5.0.

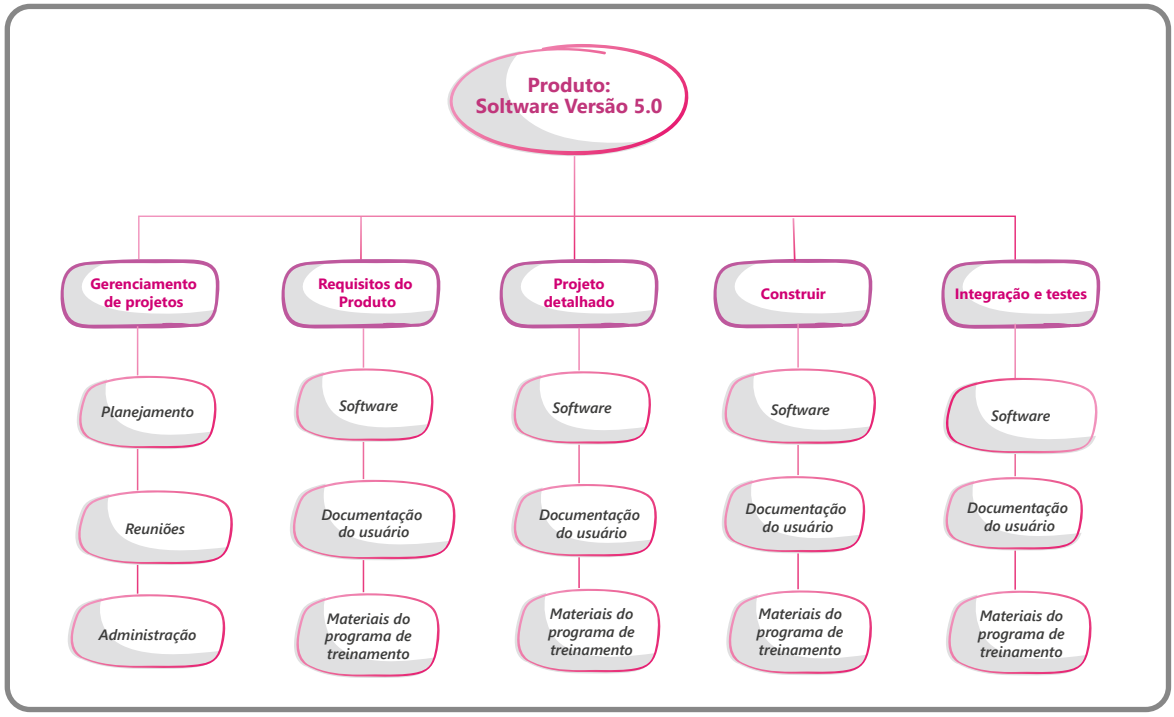

Fonte: Adaptado por Universidade La Salle (2020) com base em PMI (2017).

Observe na figura que o produto do projeto chama-se Software Versão 5.0 e ele está organizado em cinco fases: Gerenciamento do Projeto, Requisitos do Produto, Projeto Detalhado, Construir e a Integração e Testes. É importante destacar que esta segunda fase estabelece o ciclo de vida do projeto. Por fim, são identificados os subprodutos. Para que se possa atingir os objetivos do projeto, é necessário que a equipe desenvolva reuniões e apresentações.

Figura 2.7 – EAP aplicado à construção de uma casa.

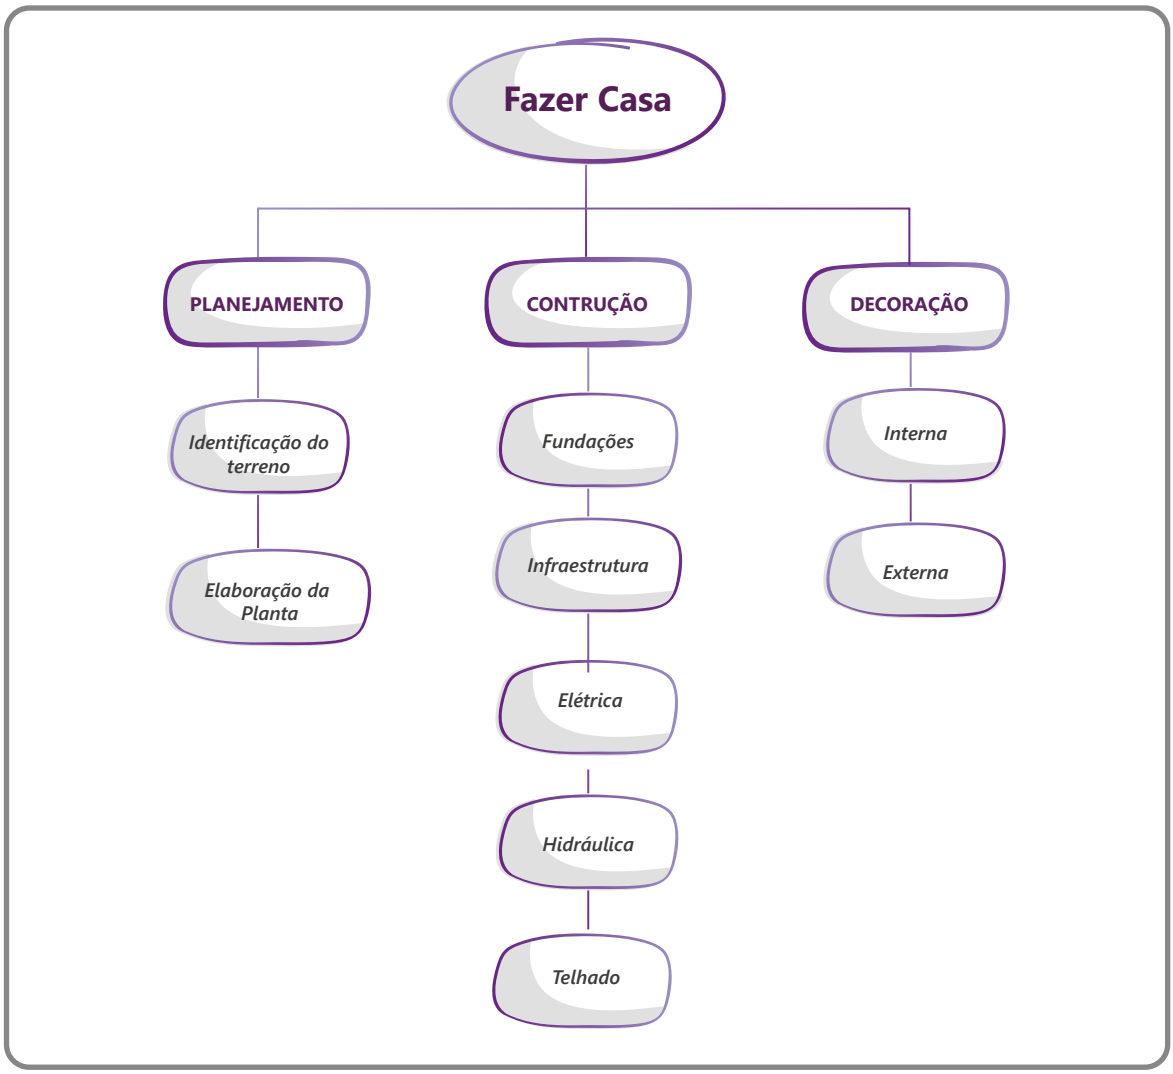

Fonte: Elaborado pelos autores (2019).

Observe na figura anterior que o projeto chama-se Fazer Casa. Este projeto está organizado em três fases, que são: Planejamento, Construção e Decoração. Mais uma vez, a segunda fase estabelece o ciclo de vida do projeto, ou seja, cada etapa e o todo do projeto. Por fim, são identificados os subprodutos. Para que se possa atingir os objetivos do projeto, é necessário que a equipe estabeleça uma comunicação.

Segundo o Guia PMBOK (PMI, 2017), os níveis mais inferiores da EAP são chamados de pacotes de trabalho, cujos principais objetivos são: identificar as tarefas do projeto, fornecer um mapa do que está sendo executado, facilitar o processo do controle, estabelecer um ponto de partida para o cronograma e os custos e auxiliar na atribuição e distribuição das atividades.

Para melhor gerenciamento, os pacotes de trabalho devem ser identificados como unidades gerenciáveis que podem ser planejadas, orçadas e controladas. Nesse

sentido, respondendo a nossa segunda questão contextual, podemos considerar que as etapas de um projeto, além de seguirem uma sequência lógica, necessitam ser gerenciadas como pacotes de trabalho. Por exemplo, para levantar as paredes, há todo o planejamento de aquisição de materiais, como tijolos, cimento etc., orientação das pessoas e da forma de execução.



SAIBA MAIS

Escopo ou Desejo? Como atender com sucesso? Nesse texto de Walther Krause, você vai encontrar informações gerais referente à definição de escopo em projetos. O autor reforça a importância da visão sistêmica do gerente de projetos, assim como é referenciada a questão das mudanças/ajustes no decorrer da elaboração do documento, enfatizando que a comunicação entre as partes é fundamental para que todas informações relevantes sejam compartilhadas. Acesse em <clique aqui>.


2.2 Estimativas, Recursos e Gerenciamento do Cronograma

Os processos de estimativa dependem do detalhamento do escopo, portanto quanto mais detalhado o escopo, mais preciso será o processo de estimativas. Uma vez que todo projeto deve ter seu tempo de execução controlado e monitorado (PMI, 2017), o Gerenciamento do Cronograma do Projeto inclui os processos necessários para assegurar que o projeto será implementado no prazo previsto.

Para tanto, os seguintes passo são necessários:

- **Definir as atividades**: identificar as que devem ser realizadas para produzir os diversos subprodutos do projeto, identificados na EAP;
- **Sequenciar as atividades**: verificar e registrar as relações de dependência entre as atividades;
- **Estimar a duração de cada atividade**: períodos de trabalho necessários para a implementação de cada atividade;
- **Desenvolver o cronograma**: analisar a sequência e a duração de cada atividade, e analisar os requisitos de recursos para criar o cronograma do projeto;
- **Controlar o cronograma**: controlar e documentar as mudanças no cronograma do projeto.

Figura 2.8 – Processos de gerenciamento do cronograma do projeto.

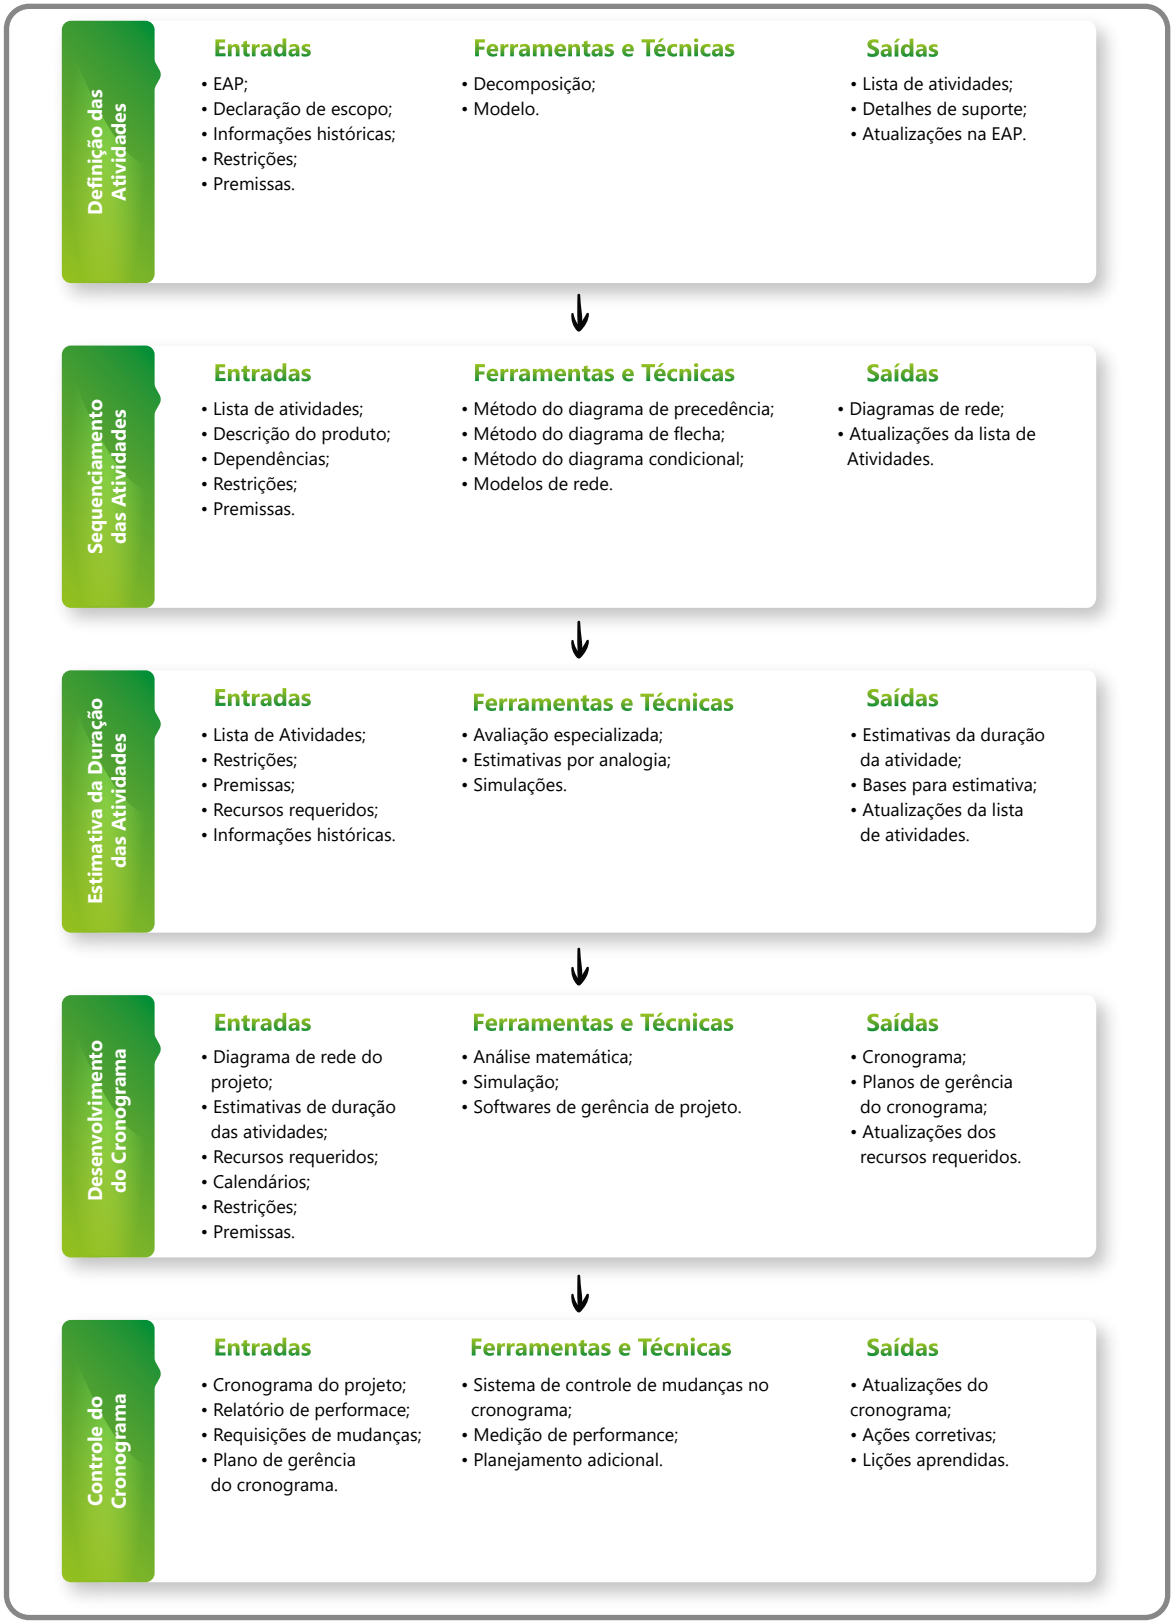

Fonte: Adaptado por Universidade La Salle (2020) com base em PMI (2017).

A definição das atividades envolve identificar e documentar as atividades específicas que devem ser realizadas com a finalidade de produzir os diversos níveis de subprodutos. O sequenciamento pode ser feito com o auxílio de aplicativos de gerência de projeto, com técnicas manuais ou utilizados ambos em conjunto. Conforme evidencia o Guia PMBOK (PMI, 2017), as técnicas manuais são mais efetivas em projetos menores e em fases iniciais de projetos maiores, enquanto os projetos maiores necessitam do auxílio computacional quando poucos detalhes estão disponíveis.

Estimar a quantidade de períodos de trabalho e o tempo necessário para a execução de cada um requer conhecimento da atividade e considerações relativas ao tempo de espera entre uma etapa e outra. É de extrema importância que uma pessoa ou grupo da equipe do projeto que tenha conhecimento e familiaridade com cada uma das atividades participe dessa etapa, a fim de confirmar essa estimativa de tempo (MENEZES, 2009).


O cronograma determina as datas de início e de fim para as atividades do projeto. O conhecimento de quais recursos estarão disponíveis, em que tempo e em quais padrões é necessário para o desenvolvimento. Dependendo do tamanho do projeto, algumas técnicas matemáticas serão necessárias, como: Método de Caminho Crítico (CPM - *Critical Path Method*), que calcula uma única data mais cedo, mais tarde, de início e de término para cada atividade, conforme a sequência lógica especificada na rede; A avaliação Gráfica e Revisão Técnica (GERT – *Graphical Evaluation and Review Technique*), que dá tratamento probabilístico tanto para rede lógica quanto para estimativas de duração das atividades; e o Programa de Avaliação e Revisão Técnica (PERT – *Program Evaluation and Review Technique*), que usa uma estimativa de média ponderada para calcular a duração do projeto (BRASIL, 2011).

2.2.1 Gerenciamento de Custos

A Gerência do Custo do Projeto inclui os processos necessários para assegurarque o mesmo será concluído dentro do orçamento aprovado. Cada processo pode envolver o esforço de um ou mais indivíduos, ou grupos de indivíduos, dependendo das necessidades do projeto, e, embora sejam teoricamente apresentados com interfaces bem definidas, na prática eles podem sobrepor-se e interagir de forma bastante complexa e intrincada (PMI, 2017).

Além disso, esse gerenciamento deve considerar as necessidades de informações das partes envolvidas no projeto, pois diferentes interessados podem avaliar os custos do projeto de maneiras diferentes e em diferentes tempos (PMI, 2017).

Figura 2.9 – Processos de gerenciamento dos custos do projeto.

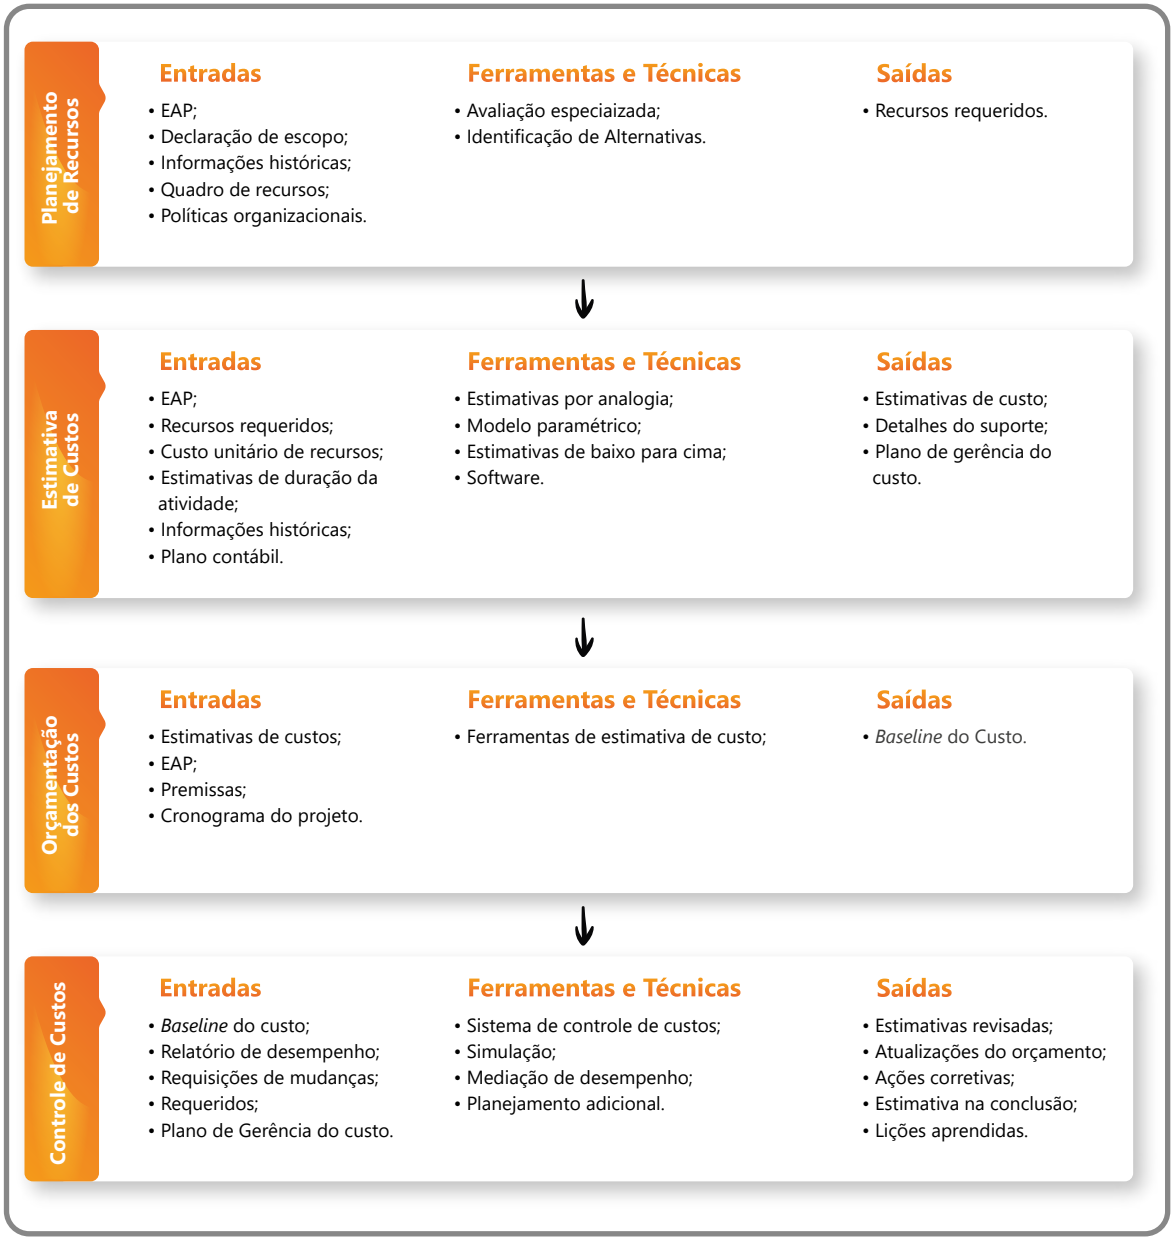


Fonte: Adaptado por Universidade La Salle (2020) com base em PMI (2017).

O planejamento dos custos envolve determinar os recursos e as respectivas quantidades de pessoas, equipamentos e materiais, e como eles devem ser usados para realizar as atividades do projeto. Ele deve estar sincronizado com a estimativa de custos, a qual está envolvida na elaboração de uma avaliação quantitativa dos resultados prováveis. A orçamentação dos custos busca alocar as estimativas aos itens de trabalho, a fim de estabelecer uma base de controle e de mensurar o desempenho do projeto, que será medido no controle de custos. Esse controle monitora o desempenho, busca impedir que mudanças não apropriadas sejam incluídas e informar as partes envolvidas sobre quaisquer mudanças nos custos (PMI, 2017).

2.2.2 Gerenciamento da Qualidade do Projeto

Os processos do gerenciamento da qualidade do projeto compreendem as atividades direcionadas tanto para a gerência do projeto quanto para o produto do projeto. A figura adiante fornece uma visão dos principais processos de gerenciamento da qualidade do projeto.

Figura 2.10 – Processos de gerenciamento da qualidade do projeto.

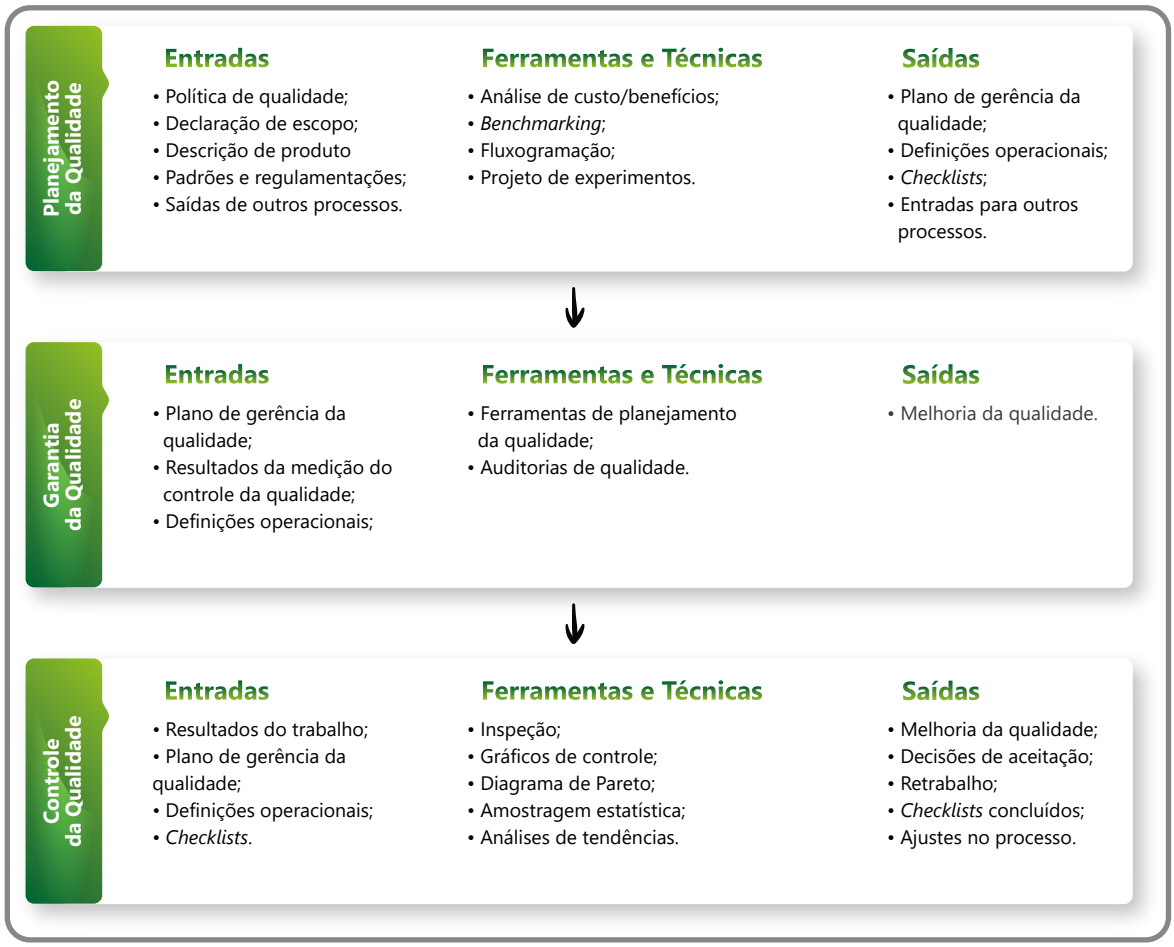

Fonte: Adaptado por Universidade La Salle (2020) com base em PMI (2017)

O planejamento da qualidade identifica os padrões de qualidade relevantes para o projeto e a melhor forma de satisfazê-los, devendo ser executado regular e paralelamente aos outros processos de planejamento do projeto. A garantia da qualidade consiste nas atividades planejadas e sistematizadas que buscam assegurar que o projeto irá satisfazer os padrões de qualidade. Assim como o planejamento da qualidade, o controle da qualidade deve ser feito durante todo o projeto, uma vez que monitora os resultados específicos para determinar se eles estão de acordo com os padrões de qualidade e procura formas de eliminar as causas de resultados insatisfatórios (PMI, 2017).

2.2.3 Gerenciamento dos Recursos

Conforme aponta o Guia PMBOK (PMI, 2017), a área de Gerenciamento dos Recursos Humanos passa a ser chamada simplesmente de Gerenciamento dos Recursos. Além da alteração de nome há também uma mudança de conceito, pois essa área passa a contemplar não apenas o tratamento dos recursos humanos, mas também os demais recursos necessários ao projeto, como os materiais e equipamentos.

O gerenciamento dos recursos do projeto inclui os processos para identificar, adquirir e gerenciar os recursos necessários para a conclusão bem-sucedida do projeto. Esses processos ajudam a garantir que os recursos certos estarão disponíveis para o gerente do projeto e a sua equipe na hora e no lugar certos. Os processos de Gerenciamento dos Recursos do Projeto são:

1. Planejar o Gerenciamento dos Recursos: o processo de definir como estimar, adquirir, gerenciar e utilizar recursos físicos e de equipe.

2. Estimar os Recursos das Atividades: o processo de estimar recursos da equipe, o tipo e as quantidades de materiais, equipamentos e suprimentos necessários para realizar o trabalho do projeto.


3. Adquirir Recursos: o processo de obter membros da equipe, instalações, equipamentos, materiais, suprimentos e outros recursos necessários para concluir o trabalho do projeto.

4. Desenvolver a Equipe: o processo de melhoria de competências, da interação da equipe e do ambiente geral da equipe para aprimorar o desempenho do projeto.

5. Gerenciar a Equipe: o processo de acompanhar o desempenho dos membros da equipe, fornecer feedback, resolver problemas e gerenciar mudanças para otimizar o desempenho do projeto.

6. Controlar os Recursos: o processo de garantir que os recursos físicos atribuídos e alocados ao projeto estejam disponíveis conforme planejado, bem como monitorar o uso planejado versus o uso real de recursos, e executar ações corretivas, conforme necessário.

Figura 2.11 – Processos de Gerenciamento dos Recursos do Projeto.

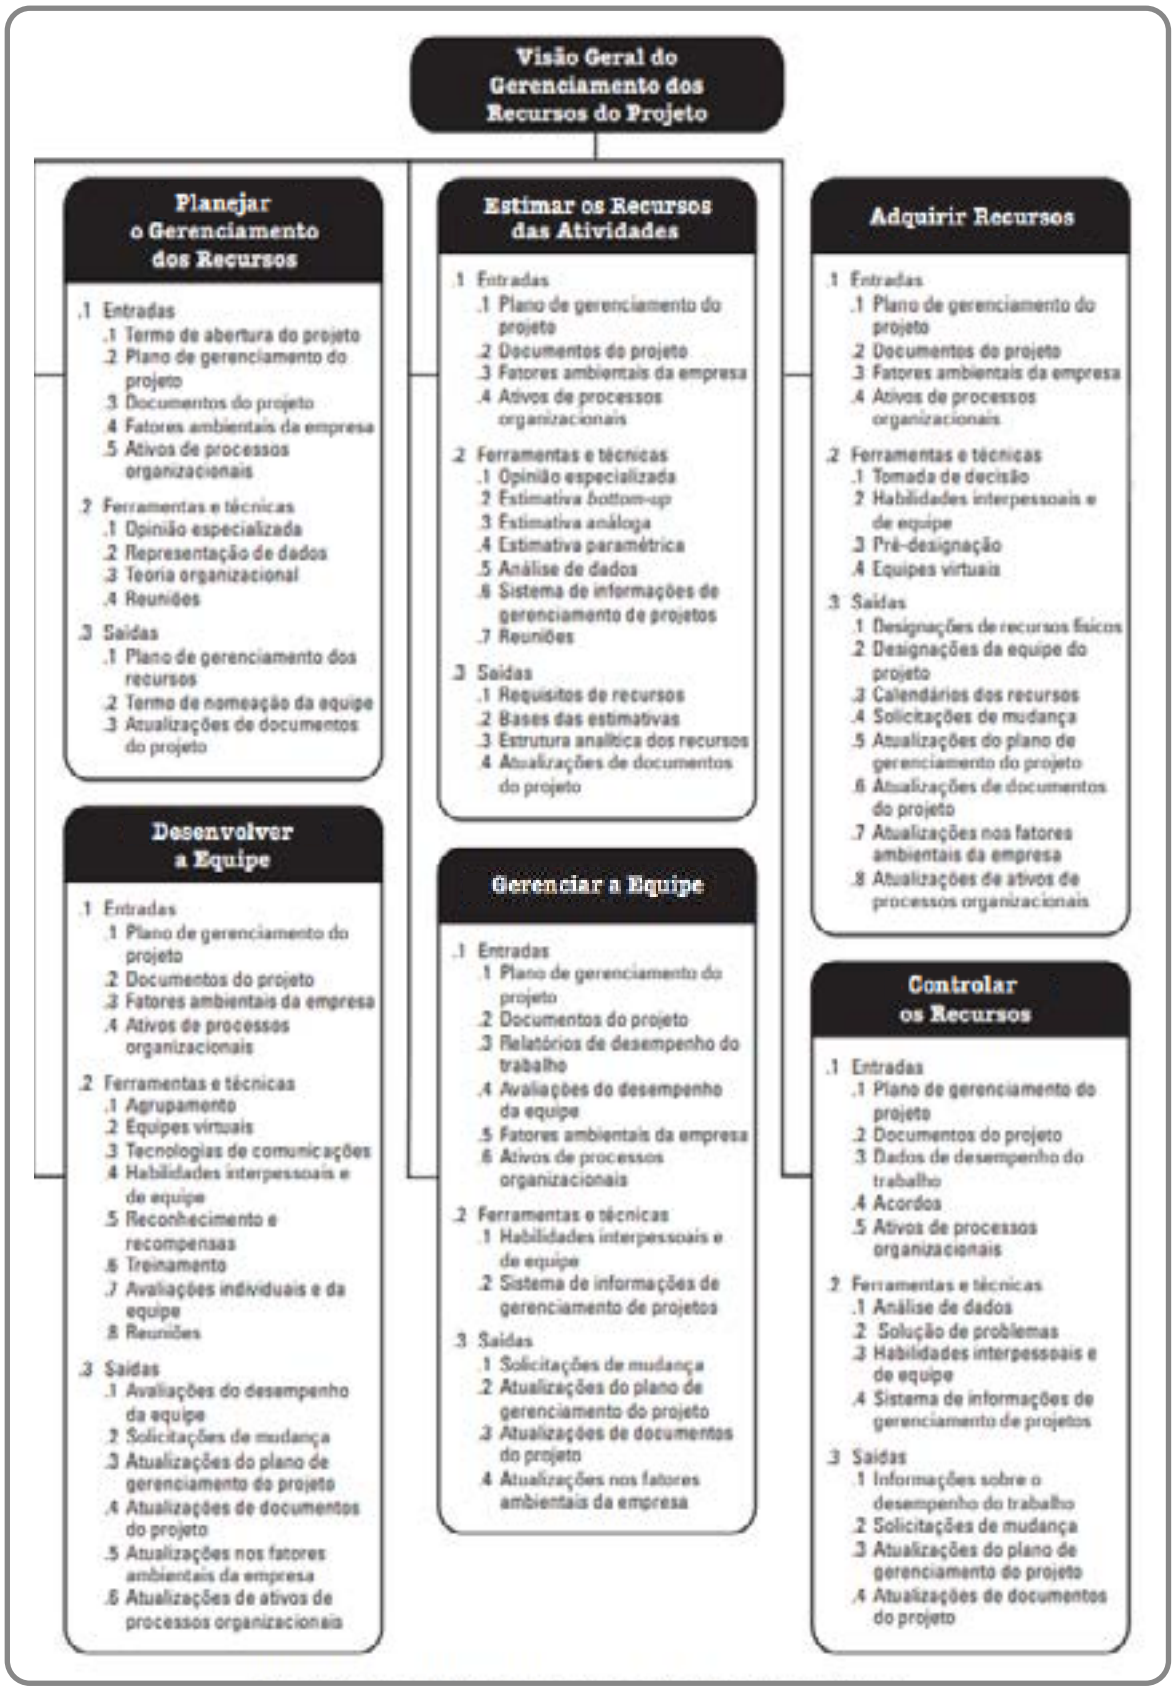


Fonte: Adaptado por Universidade La Salle (2020) com base em PMI (2017).

Os processos de gerenciamento de recursos do projeto são fortemente ligados ao gerenciamento das comunicações, visto que a estrutura organizacional do projeto terá um efeito maior nos requisitos de comunicação do projeto.

2.2.4 Gerenciamento das Comunicações do Projeto

O gerenciamento das comunicações do projeto inclui a geração apropriada e oportuna da coleta, da distribuição, do armazenamento e do controle básico das informações do projeto, de modo a fornecer ligações entre as pessoas, as ideias e as informações que são necessárias para o seu bom desenvolvimento. Todos os *stakeholders* devem estar preparados para enviar e receber comunicações na "linguagem" do projeto e devem compreender que essas comunicações afetam, de alguma forma, o projeto como um todo. A figura a seguir fornece uma visão geral dos principais processos no gerenciamento das comunicações do projeto.

Figura 2.12 – Processos de gerenciamento das comunicações do projeto.

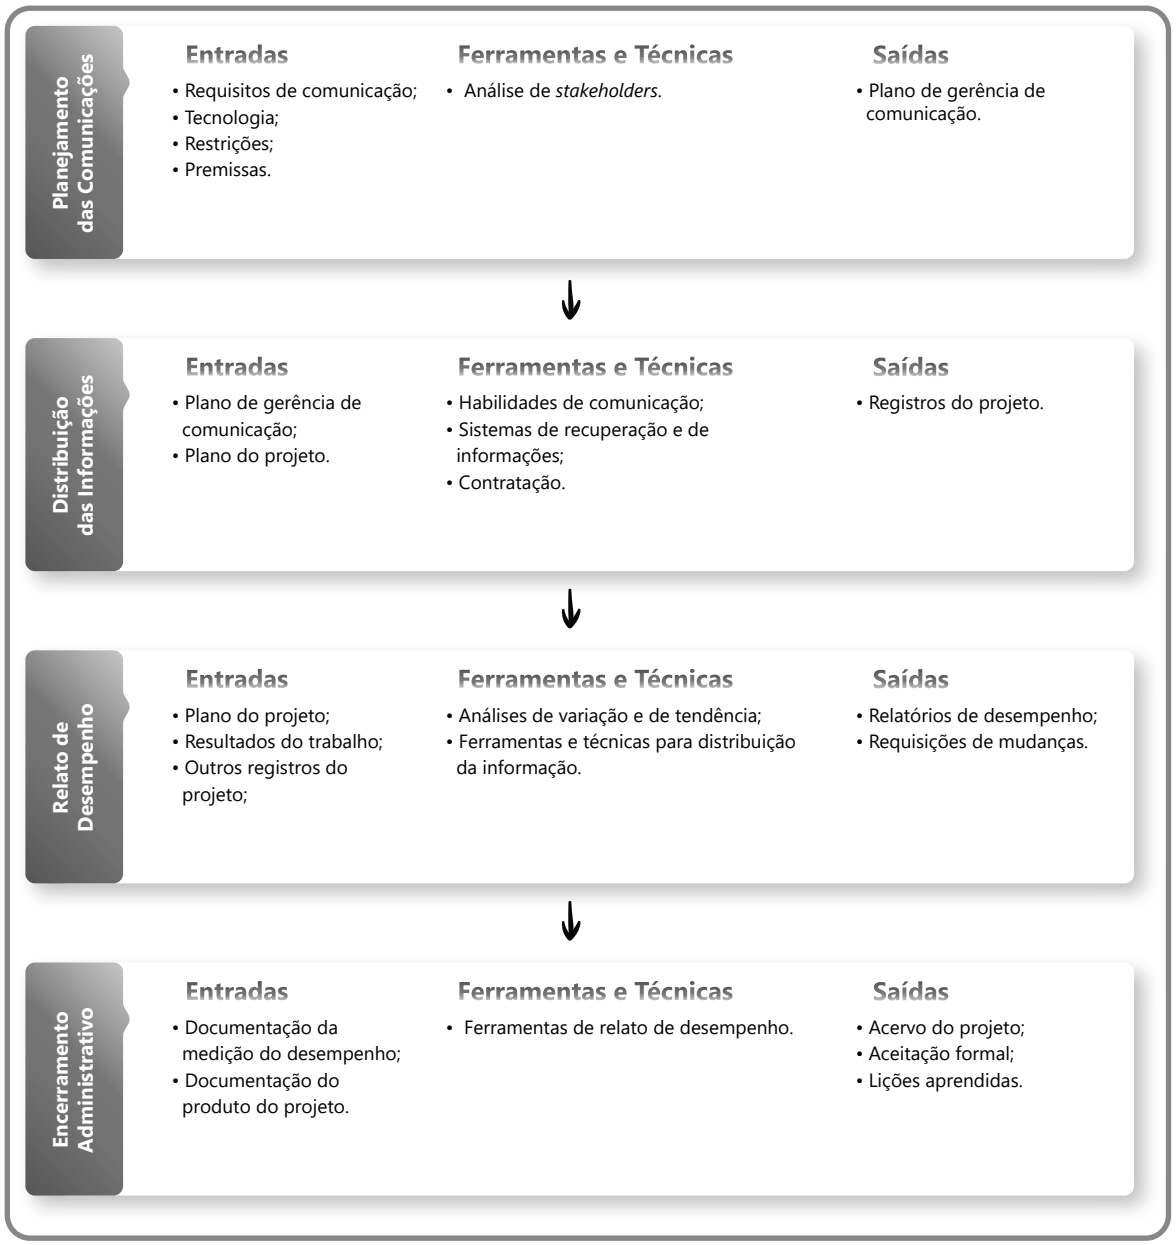

Fonte: Adaptado por Universidade La Salle (2020) com base em PMI (2017).

O planejamento das comunicações envolve determinar as informações e as comunicações necessárias a quem necessita da informação, no momento e na forma adequados. A distribuição das informações ocupa-se em disponibilizar as informações necessárias aos interessados no projeto de forma conveniente. Isso inclui implementar um plano de gerência de comunicações, bem como responder aos registros não esperados de informações.


O relato de desempenho envolve coletar e disseminar informações de desempenho sobre como os recursos estão sendo utilizados para alcançar os objetivos do projeto. Esses relatórios fornecem informações do escopo, do cronograma, de custos, de qualidade, de risco e de aquisições (PMI, 2017).

Por fim, todo projeto ou fase de projeto requer encerramento, após alcançar seus objetivos ou vir a terminar por outras razões. Assim, o encerramento administrativo consiste em verificar e documentar os resultados do projeto para formalizar a sua aceitação. Isso inclui a coleta dos registros do encerramento de todas as atividades do projeto, pois cada fase deve ser apropriadamente encerrada para assegurar que as informações úteis e importantes não sejam perdidas (PMI, 2017).

2.2.5 Gerenciamento das Aquisições do Projeto

Os processos de obtenção e gerenciamento de bens e serviços externos à organização executora de um projeto fica a cargo do gerenciamento das aquisições. Esses processos são apresentados simplificadamente na figura que segue.

Figura 2.13 – Processos de gerenciamento das aquisições do projeto.

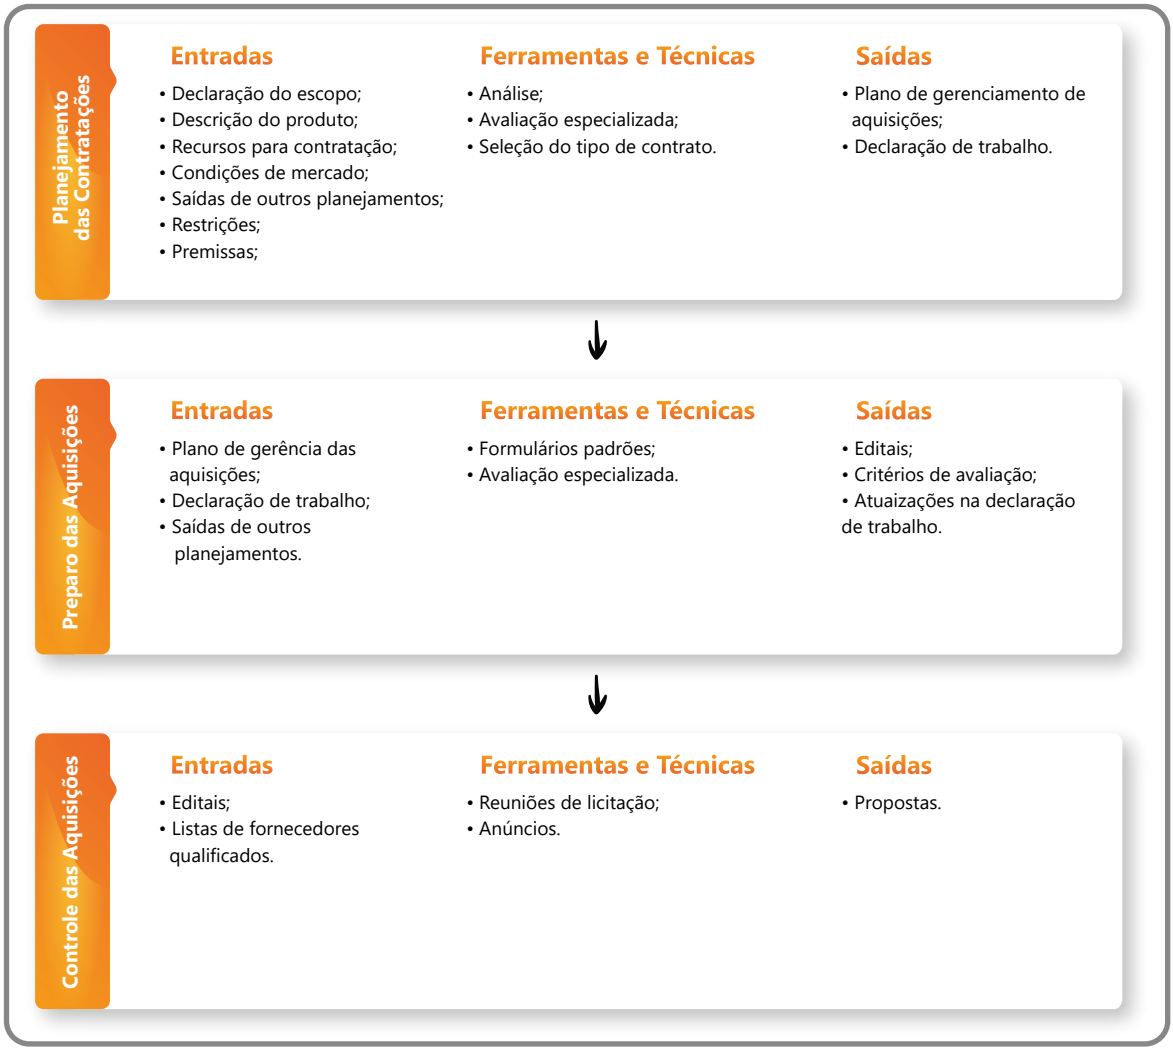

Fonte: Adaptado por Universidade La Salle (2020) com base em PMI (2017).

A identificação das necessidades do projeto que podem ser melhor atendidas pela contratação de produtos ou serviços de fora da organização fica a cargo do planejamento das aquisições. A preparação das aquisições envolve a documentação para o processo de licitação e obtenção de propostas e a coleta de informações dos fornecedores, preços e propostas. A seleção de fornecedores é feita pela aplicação de critérios de avaliação, enquanto a administração dos contratos é o processo utilizado para assegurar que o desempenho do contratado esteja adequado aos requerimentos contratuais. Por fim, o processo de encerramento do contrato é similar ao encerramento administrativo, na medida em que ele envolve tanto a verificação da execução correta e satisfatória do trabalho, quanto do fechamento administrativo do contrato, arquivando as informações para uso futuro (PMI, 2017).

2.3 Gerenciamento de Riscos do Projeto

O risco é inerente a qualquer atividade, seja ela de natureza pessoal ou profissional. Especialmente no âmbito das organizações e na nossa atuação profissional, podemos enfrentar situações de perdas ou de oportunidades. A incerteza faz parte da natureza dos negócios e a relação entre risco e retorno indica o nível de risco aceito e esperado do valor que foi investido. A gestão de risco ajuda a empresa a conhecer melhor seu contexto, sua área de atuação e incentiva um exercício fundamental para questões financeiras, administrativas, de reputação, conformidade e outras reflexões relacionadas à análise crítica operacional do negócio (IBGC, 2007).

2.3.1 Risco e Incerteza


Basicamente, gerenciar o risco é possuir um mecanismo de resposta às mudanças, sejam elas estímulos ou riscos, de modo proativo. Para isso, é necessária uma análise aprofundada dos riscos associados aos projetos, os quais devem ser previamente identificados e controlados, a fim de evitar possíveis erros, contribuir com mudanças e, até mesmo, com melhorias ao planejamento inicial do projeto (GATES, 2000).

A análise e gerenciamento de riscos têm por finalidade reconhecer e gerenciar riscos e incertezas durante o processo de execução do projeto. Risco é uma ocorrência discreta ou distinta que pode afetar o projeto para melhor ou para pior, devendo ser analisado por três componentes: pelo evento, pela probabilidade de ocorrência e pelo impacto do evento. A probabilidade pode ter valores atribuídos de forma subjetiva ou objetiva. Subjetivamente, a probabilidade é uma estimativa pessoal de confiança, quanto à possibilidade de ocorrência de um evento. Já a probabilidade objetiva é calculada com base em históricos de eventos anteriores, ou outras técnicas quantitativas (VARGAS, 2009).

2.3.2 Processos de Gerenciamento de Risco

O gerenciamento de riscos tem por objetivo identificar e analisar os riscos do projeto, buscando a maximização dos resultados de eventos positivos e a minimização das consequências de eventos negativos. Essas ações dizem respeito ao ato de planejar as respostas aos eventos de risco, as quais devem sempre se direcionar para o futuro. Dessa forma, o planejamento do gerenciamento de riscos pode ser definido como o conjunto de atividades necessárias para identificar os riscos, analisá-los e definir um plano de resposta (PMI, 2017).

Figura 2.14 – Processos de gerenciamento dos riscos do projeto.

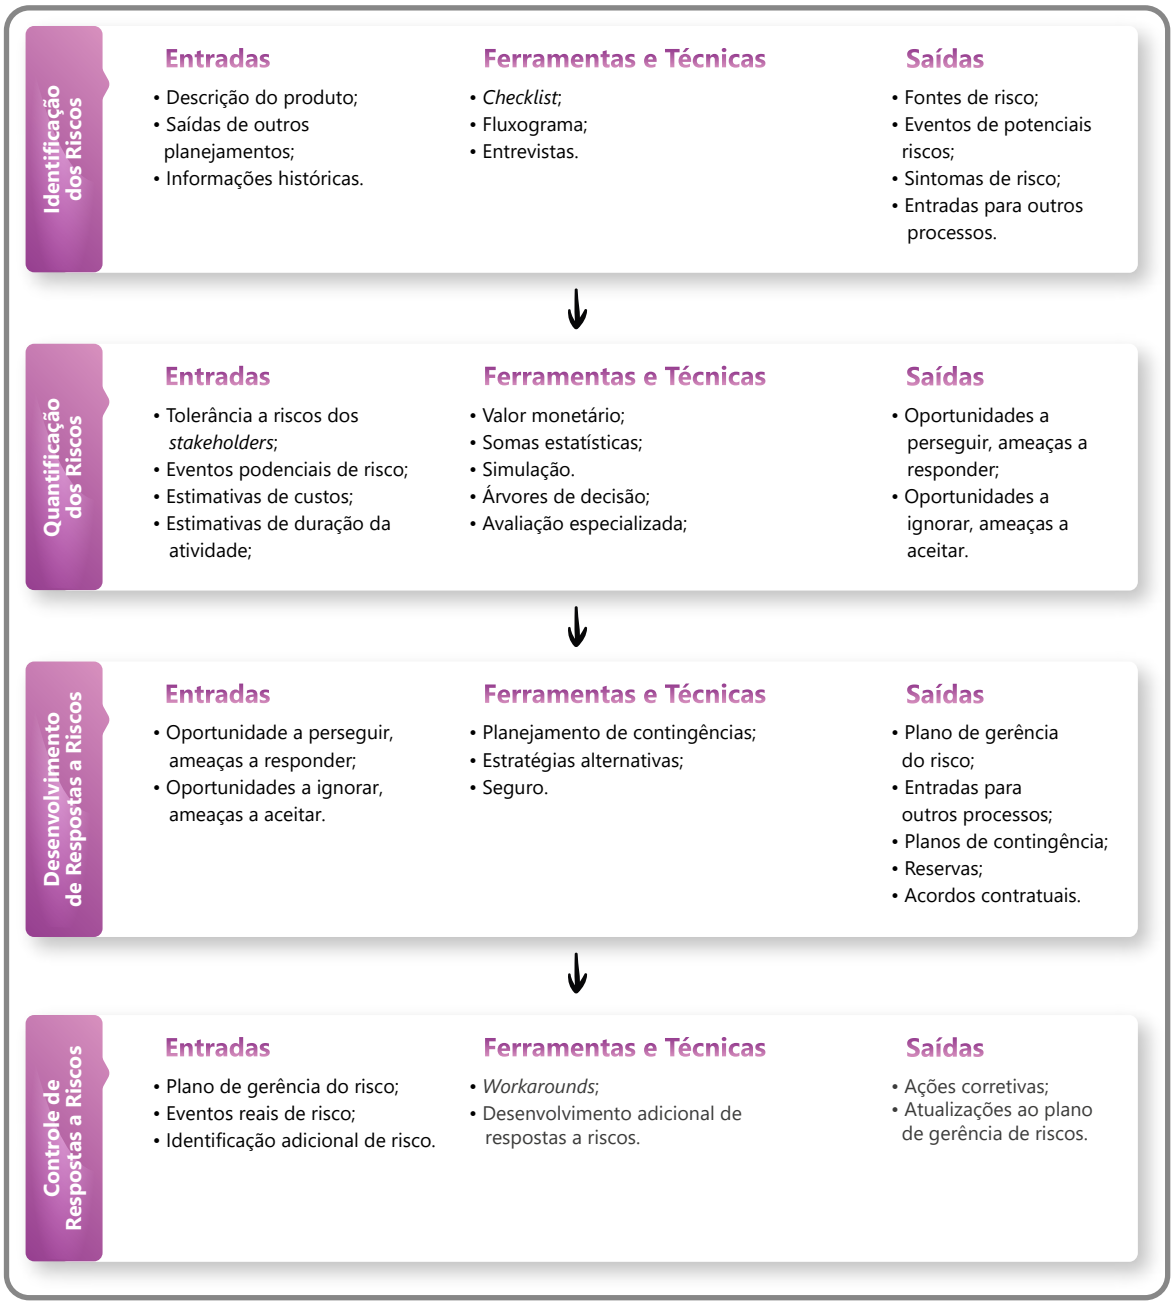

Fonte: Adaptado por Universidade La Salle (2020) com base em PMI (2017).

A identificação dos riscos consiste em determinar aqueles que têm maior probabilidade de afetar o projeto e documentar as características de cada um, identificando os eventos incertos que podem representar ameaças ou oportunidades para o projeto. Nesse processo, podem ser utilizadas diversas metodologias para identificação, de modo a abranger tanto os riscos internos – equipe, custos etc., quanto os externos – mudanças de mercado, políticas governamentais. Esse processo deve ser feito ao longo de todo o projeto, pois os riscos são mutáveis ao longo de sua execução (PMI, 2017).

A quantificação dos riscos envolve a análise e a avaliação dos mesmos e suas interações, de modo a possibilitar uma previsão de possíveis resultados para o projeto. Seu principal foco é na avaliação e combinação dessas possibilidades de ocorrência e seus possíveis impactos que justifiquem uma resposta. É importante ressaltar que um evento de risco único pode causar múltiplos efeitos, como quando a entrega tardia de um componente-chave produz um aumento substancial no custo, atrasos no cronograma, pagamentos de penalidades ou um produto de baixa qualidade (VARGAS, 2009).


Identificados os riscos e suas potencialidades, é necessário o desenvolvimento de respostas às ameaças que, de modo geral enquadram-se em uma das três categorias: **evitar** – eliminar uma ameaça específica, normalmente eliminando sua causa; **mitigar** – reduzir os seus efeitos; ou **aceitar** – aceitar as consequências, ou seja, desenvolver um plano de contingência e simplesmente reformular o planejamento (VARGAS, 2009).

Por fim, o controle de respostas aos riscos é o processo de acompanhamento dos riscos identificados e residuais, durante todo o projeto. O projeto deve ser continuamente monitorado em busca de novos riscos. Quando mudanças ocorrem, o ciclo básico de identificação, quantificação e resposta se repete. Importante ressaltar que, mesmo diante da mais cuidadosa e completa análise de risco, não se pode identificar todos; portanto, o controle e as interações são permanentemente necessários (PMI, 2017).

2.4 Áreas de Conhecimento e Grupos de Processos

O gerenciamento das áreas de conhecimento não ocorre em todos os grupos de processos, conforme podemos observar na figura a seguir:

Quadro 2.1 – Áreas de conhecimento e grupos de processos.

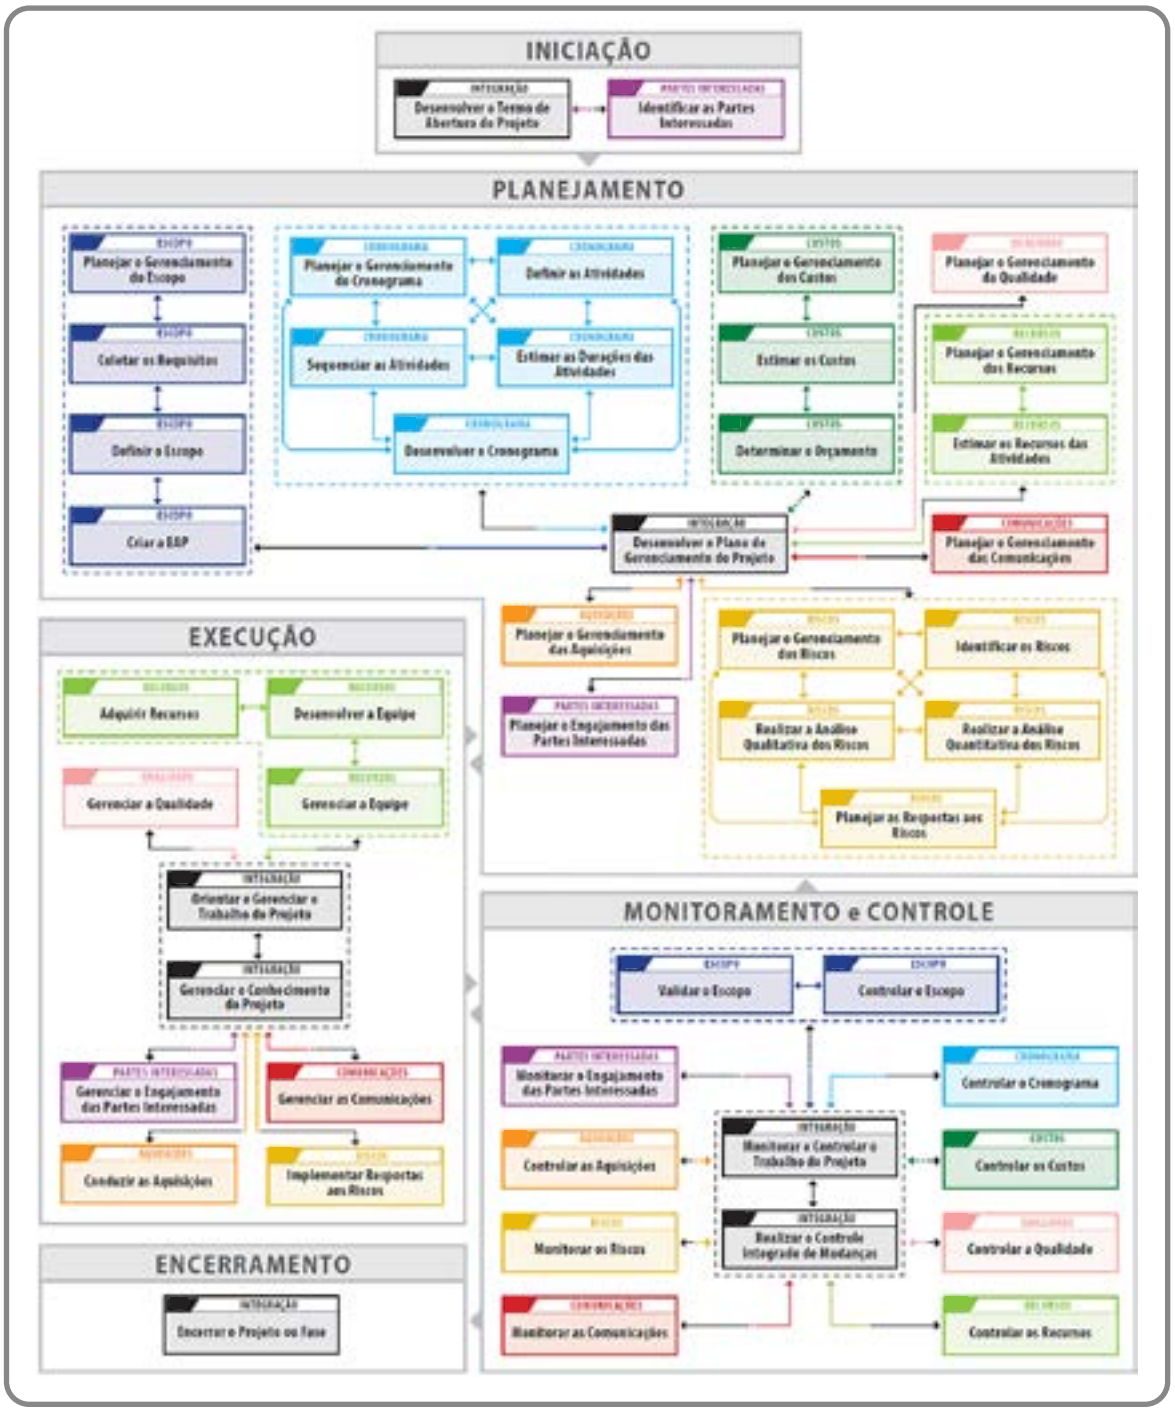

Fonte: Adaptado de Vargas (2020) com base em PMI (2017).

Em todas as entradas de processos, estão presentes o Termo de Abertura do Projeto, os documentos do projeto, os fatores ambientais da empresa e demais saídas dos processos anteriores. O gerenciamento da integração, conforme visto anteriormente, permeia todos as fases e processos de gerenciamento do projeto, desde a iniciação até o encerramento. As partes interessadas, da mesma forma, envolvem-se desde a iniciação, passando pelo planejamento, execução e controle do projeto. As áreas de conhecimento relacionadas ao escopo, cronograma e custos fazem parte do planejamento e do controle do projeto; enquanto as demais áreas de conhecimento (qualidade, recursos, comunicações, riscos e aquisições) atuam também na fase de execução (PMI, 2017).

2.4.1 Processos de Iniciação

Como já vimos na Unidade 1, esta é a fase de autorização do projeto. Nela é definida um novo projeto ou nova fase de um projeto existente. Os processos de iniciação estão presentes em cada área de conhecimento do Gerenciamento da Integração, no desenvolvimento do termo de abertura do projeto e identificação das partes interessadas.

2.4.2 Processos de Planejamento

São os processos para definir o escopo do projeto, que refinam os objetivos e permitem o desenvolvimento do plano de ação necessário para alcançá-los. Os processos de planejamento são gerenciados pelo(a) (PMI, 2017):

- **Integração**: desenvolvimento do plano de gerenciamento do projeto;
- **Escopo**: coleta dos requisitos, definição do escopo e criação da EAP;
- **Cronograma**: definição das atividades e sua sequência, estimativa de recursos e duração de cada uma e desenvolvimento do cronograma;
- **Custos**: estimativa de custos e definição do orçamento;
- **Qualidade**: planejamento da qualidade;
- **Recursos**: planejamento dos recursos necessários ao projeto;
- **Comunicação:** planejamento das comunicações;
- **Riscos**: identificação, análise e planejamento do gerenciamento de riscos;
- **Aquisição**: planejamento das aquisições.

2.4.3 Processos de Execução

A execução do projeto envolve a coordenação de pessoas e outros recursos para sua execução. Os processos de execução em cada área de conhecimento são (PMI, 2017):

- **Integração**: Orientação e gerenciamento da execução do projeto;
- **Qualidade**: garantir a qualidade;
- **Recursos**: mobilização da equipe do projeto e envolvimento das demais partes interessadas;
- **Comunicação**: distribuição de informações e gerenciamento das expectativas das partes interessadas;
- **Aquisição**: realizar as aquisições do projeto.

2.4.4 Processos de Monitoramento e Controle

Consiste na medição e monitoramento do desempenho do projeto, de modo a garantir que os seus objetivos sejam alcançados, através de ações corretivas tomadas a tempo e quando necessário. Neste processo, o desempenho do projeto é observado e mensurado de forma periódica e uniforme para identificar variações em relação ao plano. Os processos de monitoramento e controle em cada área de conhecimento são (PMI, 2017):

- **Integração**: monitoramento e controle do trabalho do projeto e controle integrado das mudanças.
- **Escopo**: verificação e controle do escopo;
- **Cronograma**: controle do cronograma.
- **Custos**: controle dos custos
- **Qualidade**: controle da qualidade;
- **Comunicação**: informar o desempenho;
- **Riscos**: monitoramento e controle dos riscos;
- **Aquisição**: administração das aquisições.

2.4.5 Processos de Encerramento

A aceitação formal do fim do projeto, ou de uma de suas fases, em acordo com as definições do escopo incluem a aceitação do cliente e do patrocinador, revisão pós-projeto ou fase, documentação das lições aprendidas, atualização dos ativos dos processos e arquivamento dos documentos relevantes. Podemos determinar esses processos como (PMI, 2017):

- **Integração**: encerramento do projeto ou da fase;
- **Aquisição**: encerramento das aquisições e das contratações.

Síntese da Unidade

Os processos de gerenciamento de projetos são divididos em nove áreas diferentes do conhecimento: o Gerenciamento da Integração, que busca assegurar a coordenação dos diversos elementos do projeto; o Gerenciamento de Escopo, que define o foco do projeto; o Gestão do Cronograma, que busca garantir que o projeto se realize no tempo aprazado; o Gerenciamento de Custos, que estima, elabora orçamentos e controla custos; o Gerenciamento de Qualidade, que controla as políticas de qualidade do projeto; o Gerenciamento de Recursos, que busca o planejamento dos recursos empregados no projeto; o Gerenciamento de Comunicações, que gera, coleta, distribui e armazena as informações do projeto; o Gerenciamento de Riscos, que busca reduzir a incidência e o impacto de eventos negativos no projeto; e o Gerenciamento de Aquisições, que inclui a aquisição de produtos ou serviços necessários.

Bibliografia

ALVES, E. M.; GUIMARÃES, M. P.; TANNÚS, S. P. Análise de Viabilidade de Projeto para Implantação de uma Academia Esportiva Baseada no Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®). In: **Gestão do Conhecimento e Inovação Volume 4**. Belo Horizonte: Poisson, 2017.

BRASIL. Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. **Metodologia de Gerenciamento de Projetos do SISP**. Brasília, 2011, p. 75.

CAMARGO, M. R. **Gerenciamento de Projetos**: fundamentos e prática integrada. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.

GATES, W. H. **Business the Speed of Thought**, New York, NY: Warner Books, 2000.

IBGC. Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. **Guia de orientação para o gerenciamento de riscos corporativos**. São Paulo: IBGC, 2007, 48p.

KERZNER, H. **Gerenciamento de projetos**: uma abordagem sistêmica para planejamento, programação e controle. São Paulo: Blucher, 2016.

LARSON, E. W.; GRAY, C. F. **Gerenciamento de projetos**: o processo gerencial. Porto Alegre: AMGH, 2016.

MENEZES, L. C. M. **Gestão de projetos**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

PMI. Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos. **Guia PMBOK**. 6a. ed. – EUA: Project Management Institute, 2017.

VARGAS, R. V. **Manual prático do plano do projeto**. 4º Ed. Rio de Janeiro, Brasport, 2009.



CONTRIBUA COM A QUALIDADE DO SEU CURSO

Se você encontrar algum problema neste material, entre em contato pelo email **eadproducao@unilasalle.edu.br**. Descreva o que você encontrou e indique a página.

Lembre-se: a boa educação se faz com a contribuição de todos!

UNIVERSIDADE
LaSalle
Viver é **evoluir.**

Av. Victor Barreto, 2288 I Canoas - RS
CEP: 92010-000 | 0800 541 8500
eadproducao@unilasalle.edu.br

9 786554 410212
